
Implémentation d’un ERP dans une Organisation

Implémentation d'un ERP dans une organisation

- 10-20 % du personnel est touché
- Problématiques :
  - conduite du changement
  - adaptabilité aux utilisateurs occasionnels de SAP => mysap.com
  - démultiplication des transactions
  - dispersion de l 'information => nouvelle GUI


  - adéquation aux besoins



Quatre problématiques d'ingénierie

- Appréhender la discordance conceptuelle entre les niveaux
- Analyser la corrélation entre les besoins de l'organisation et les fonctionnalités de l'ERP
- Modéliser la relation de d'adéquation (fitness) de la solution envisagée
- Affiner cette relation
- Évaluer la qualité de la relation

Approche dirigée besoin vs approche dirigée PGI

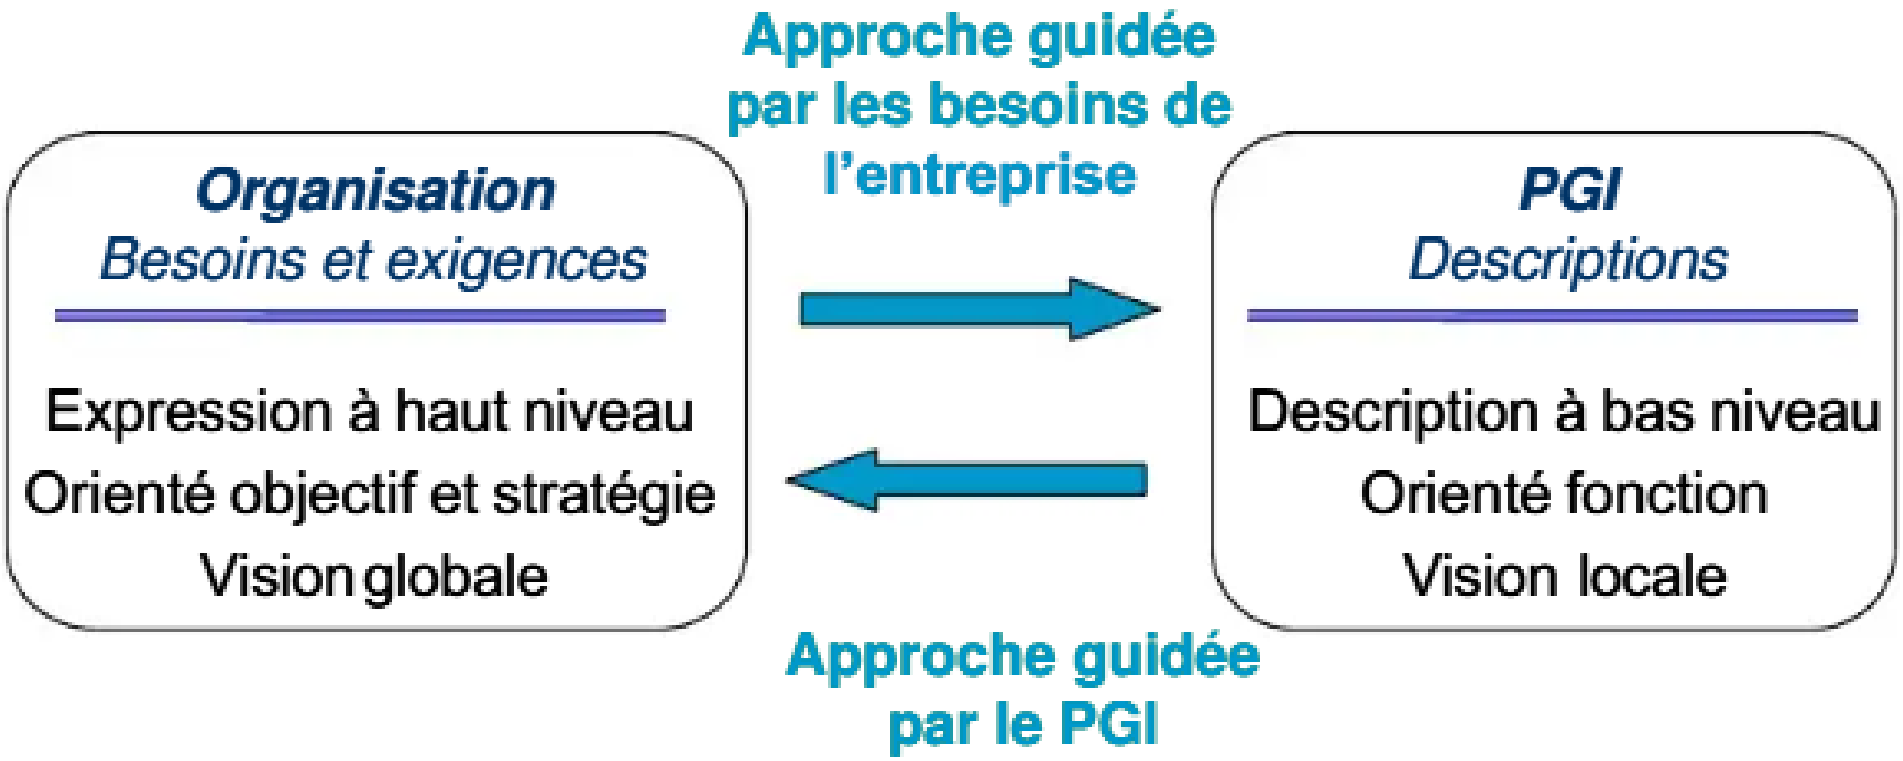

Approche guidée par les besoins

- Classique
- Souhaitée par tous les acteurs métier de l'entreprise
- Permet d'installer un système qui répondrait exactement aux besoins de l'entreprise

Approche guidée par les fonctionnalités du PGI


- Souhaitée par l'éditeur et les intégrateurs
- Permet d'installer les fonctions standard du PGI
- Simple paramétrage et configuration
- Cherche à éviter de re-développer des fonctions particulières pour prendre en compte les spécificités de l'organisation.

Autres difficultés

- Périmètre du projet :
  - étendue fonctionnelle et organisationnelle du projet floues
  - dérives, variations, écarts de périmètre
    typiquement : ajout d 'un module, nouvelle société participant à l 'implémentation, ajout d 'une fonctionnalité répondant mieux aux besoins

- Développement de spécifique
  - transition des données
  - adéquation au besoin tq reporting, interfaces, personnalisation
- Adaptation de l 'organisation
  - l 'objectif « 0 spécifique » est illusoire !!

Les acteurs du projet



- Pilotage
- Sponsors
- Consultants
- Client
- Technique
- Formation
- Conduite du changement
- Sécurité

Plan

- ASAP (SAP)
- Implex (Intentia)
- Rapide RE (Gateway Consulting)
- Fast Track (Deloitte & Touch)
- Total solution et Accelerated migration (Ernst & Young)
- Conclusions et perspectives

ASAP

- S 'inscrit dans cycle de vie : analyse, implémentation, amélioration continue
- Cinq phases
  - construction (du projet)
  - conception
  - réalisation
  - préparation du démarrage
  - mise en production
- Stratégies classiques :
  - « big bang »
  - incrémentiel, "par lot"
  - par optimisation version existante

1 : Construction du projet

- Planification initiale du projet
  - planning avec jalons
  - périmètre
  - organisation de l ’équipe projet
- Définition des procédures du projet
- Formation des participants au projet
- Réunion de lancement
- Identification des besoins techniques
- Mise en place du contrôle qualité
- Outils : accélérateurs
- Livrables
  - charte projet : objectifs, ressources, planning, budget, indicateurs de performance, organisation et commités
  - charte de conduite du changement

2 : Conception générale

- Gestion de projet, Conduite de changement & formation
- Développement de l'environnement système
- Définition de la structure entreprise
- Analyse & définition des processus de gestion
- Outils :
  - Qadb, ARICE (= Authorization, Reports, Interfaces, Conversions, Extensions)
  - Diagram Explorer & LiveModeller (IntelliCorp), ERP Modeller (CASEWise)
- Livrables :
  - "blueprint" : document de conception générale
  - feuilles de travail
    - OSL : Organisational Structure List
    - BPML : Business Process Master List
    - DL : Development List
    - AL : Authorization List

3 : Réalisation

- Gestion de projet, Conduite de changement & formation
- Paramétrages initial/final approbation
- Administration système
- Développement de spécifiques (abap, interfaces, etc)
- Tests d'intégration
- Contrôle qualité
- Outils : Implementation Guide (configurable)
- Livrables :
  - Synthèses des scénarios de gestion
  - MOT : mode opératoire par transaction (transactions R/3 à mettre en œuvre)
  - Plan de paramétrage et de test
  - Programme de développement (besoins détaillés)
  - Support de formation utilisateur final

4 : Préparation du démarrage

- Gestion de projet et formation
- Administration système
- Planification détaillée du passage en production
- Basculement
- Contrôle qualité

- Outils : feuilles Excel de synthèse

- Livrables :
  - Tests de montées en charge et volumétrie
  - Plan détaillé de basculement
  - Supports de formation utilisateur final
  - Manuel d'exploitation technique

5 : Mise en production et support

- Assistance sur le système productif
- Fin de projet

- Livrables : rapport de performance de système en production

Livrables clés de ASAP

